



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Úvodní konference v rámci projektu „Domovník – preventista“

Název projektu:

Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

(sebe)Evaluace **projektu „Domovník – preventista“** (klíčová aktivita 07)

Evaluační tým

- nezávislá evaluátorka: **Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.**
- věcný gestor projektu: **JUDr. Tomáš Koníček**
- asistentka projektu: **Radka Vaňasová**
- projektový manažer: **Mgr. Petr Dučák**



Obsah prezentace - evaluace projektu DP

- I. Jak na projektu probíhá evaluace**
- II. Časová a věcná návaznost projektu na předchozí aktivity**
- III. Logický model projektu**
- IV. Rizika dle evaluace pro dobrý průběh projektu**
- V. Shrnutí zjištění vstupní procesní evaluace**
- VI. Co bude – spolupráce zapojených aktérů na průběžné a dopadové evaluaci**



I. Jak na projektu probíhá evaluace

Cílem klíčové aktivity 07 Sebeevaluace projektu je:

- 1. vyhodnocení procesu realizace projektu**
- 2. zhodnocení výsledků dosažených projektem**

Evaluace bude probíhat v průběhu celého projektu formou tří vstupů:

- vstupní evaluace nastavení projektu (I-IV 2017)
- evaluace v průběhu projektu formou sběru vstupních dat v obcích a zhodnocení metodik (X.2017- VI.2018)
- vyhodnocení dopadů v zapojených obcích (VI.2019 – VI.2020)



II. Časová a věcná návaznost na předchozí aktivity

2009 ... 2013 ... 2016 **2017** 2018 2019 2020

(od 2009) Program **Asistent prevence kriminality** z Programu prevence kriminality (MV ČR) – *APK působí na veřejných prostranstvích*

Identifikována potřeba obcí v SVL zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v obecních domech a jejich bezprostředním okolí

(od 2013) pilotní test projektu **Domovník - preventista** z Programu prevence kriminality (MV ČR)

Identifikována potřeba projektu vytvořit účinné nástroje, metodické postupy, definovat standardy a otestovat jejich funkčnost a ověřit smysluplnost projektu v praxi před dalším šířením.

(od 9/2016 do 8/2020) projekt **Domovník - preventista** z Operačního programu Zaměstnanost

I. přípravná (metodická) fáze projektu	II. aplikační fáze projektu (1/2018 – 12/2019)	dokončení
<ul style="list-style-type: none">- 1. nástroj: Metodika výběru, činnosti a přípravy DP- 2. nástroj: Hodnotící a kvalifikační standardy pracovní pozice DP (pro zařazení do NSP a NSK)- 3. nástroj: Metodický standard pro výběr obcí zařazených do projektu DP- výběrové řízení na dodavatele služeb- sebeevaluace	<ul style="list-style-type: none">- výběr 10 spolupracujících obcí podle metodiky- průběžná spolupráce s 10 obcemi se SVL- výběr a zaměstnání 30 osob na pracovní pozici DP po dobu 24 měsíců podle metodiky- proškolení a supervize činnosti DP podle metodiky- osvěta v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou- sebeevaluace a vyhodnocení školících aktivit	<ul style="list-style-type: none">- revize nástrojů (metodik)- uzavření projektu




III. Logický model projektu Domovník-preventista

Cílem logického modelu ve formě tzv. teorie změny je ukázat **jakým způsobem** chce projekt naplnit své cíle.

Teorie změny ukazuje **očekávané vazby** mezi:

- **vstupy** (finančními zdroji a lidmi pracujícími na projektu)
- **aktivity** (co se bude v projektu dělat)
- **výstupy** (měřitelné zakončení aktivit projektu)
- **výsledky/okamžité dopady** (očekávaná změna v chování)
- **dlouhodobé dopady** (žádoucí změna systému)

Teorie změny projektu Domovník-preventista

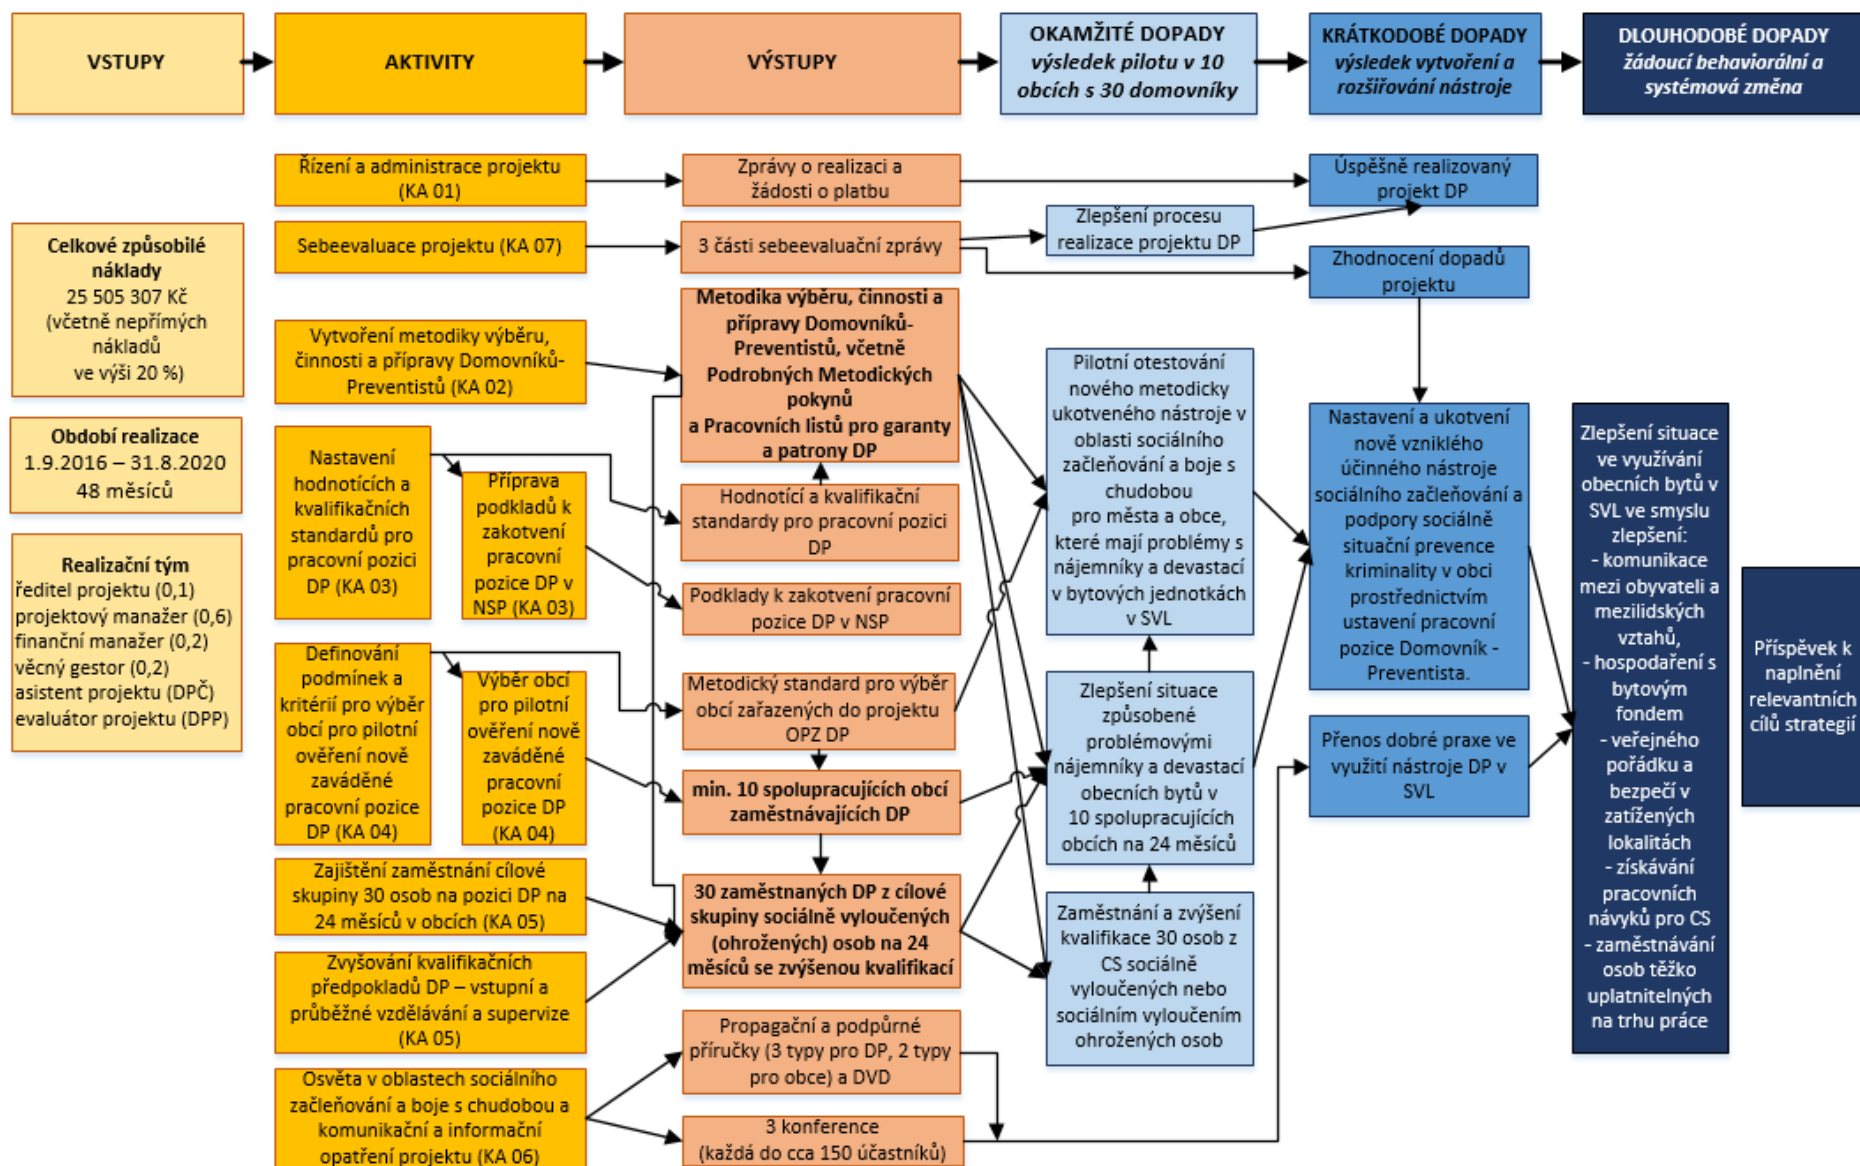



IV. Rizika dle evaluace pro dobrý průběh projektu

Vstupní evaluační zpráva po zhodnocení procesního nastavení projektu konstatuje jako největší tato rizika:

- **malá velikost realizačního týmu na MV ČR**
pouze 1 osoba na částečný úvazek (0,2) v pozici pro věcné zabezpečení projektu (bez zajištěné zastupitelnosti)
- **závislost na úspěšném výběru kvalitního dodavatele na VZMR „vzdělávání, supervize, metodika“**
v souvislosti s nemožností nahradit tohoto dodavatele v případě jeho výpadku interními kapacitami

Rizika spojená s nezájmem obcí o spolupráci nebo nezájmem CS o pracovní pozici lze, vzhledem ke zkušenostem z *Programu prevence kriminality* z předchozích let, považovat za nepravděpodobná.



V. Shrnutí zjištění vstupní procesní evaluace

- Projekt je dobře provázán se strategiemi, k jejichž naplnění má přispívat, v některých je výslovně uveden.
- Klíčové aktivity a harmonogram projektu jsou přehledné a realistické.
- Projektová logika je srozumitelná a v předpokládaných kauzálních vazbách nebyly identifikovány závažné nedostatky.
- Rizikem úspěšné realizace projektu je závislost na externím dodavateli vzhledem k malé velikosti interního realizačního týmu.



VI. Co bude – spolupráce zapojených aktérů na průběžné a dopadová evaluaci

- Na začátku realizace (přelomu let 2017 a 2018) kontaktuje evaluátor zapojené obce a místní aktéry poprvé, aby udělal snímek **„jaká je situace při zahájení projektu“**.
- Na konci realizace (přelomu let 2019 a 2020) kontaktuje evaluátor zapojené obce a místní aktéry podruhé, aby udělal snímek **„jaká je situace po realizaci projektu“**.

Cílem bude odpovědět např. na tyto otázky:

- *Jaká očekávání od projektu DP měli při jeho zahájení klíčoví aktéři a jak byla tato očekávání v průběhu jeho realizace změněna a naplněna?*
- *Jaký byl přínos projektu vnímaný cílovou skupinou Domovníků - preventistů?*
- *V jaké míře bylo dosaženo zamýšlených dopadů projektu (podle teorie změny)?*
- *Využívají (či to plánují) obce nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci „DP“ i při nutnosti financovat jej z vlastních zdrojů?*



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

V případě otázek k evaluaci projektu kontaktuje garantku za sebeevalauci:

Ing. Jiřina Svitáková, MBA, Ph.D.

jirina.svitakova@gmail.com
